




Особенности закупок в сфере строительства и капитального ремонта

отдел реализации государственной политики
в сфере закупок, развития контрактной системы,
методологического сопровождения
деятельности заказчиков управления финансов
Липецкой области

ПРАКТИКА СУБЪЕКТОВ ЦФО РФ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ ЗАКУПОК НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ (по состоянию на 30.11.2021)

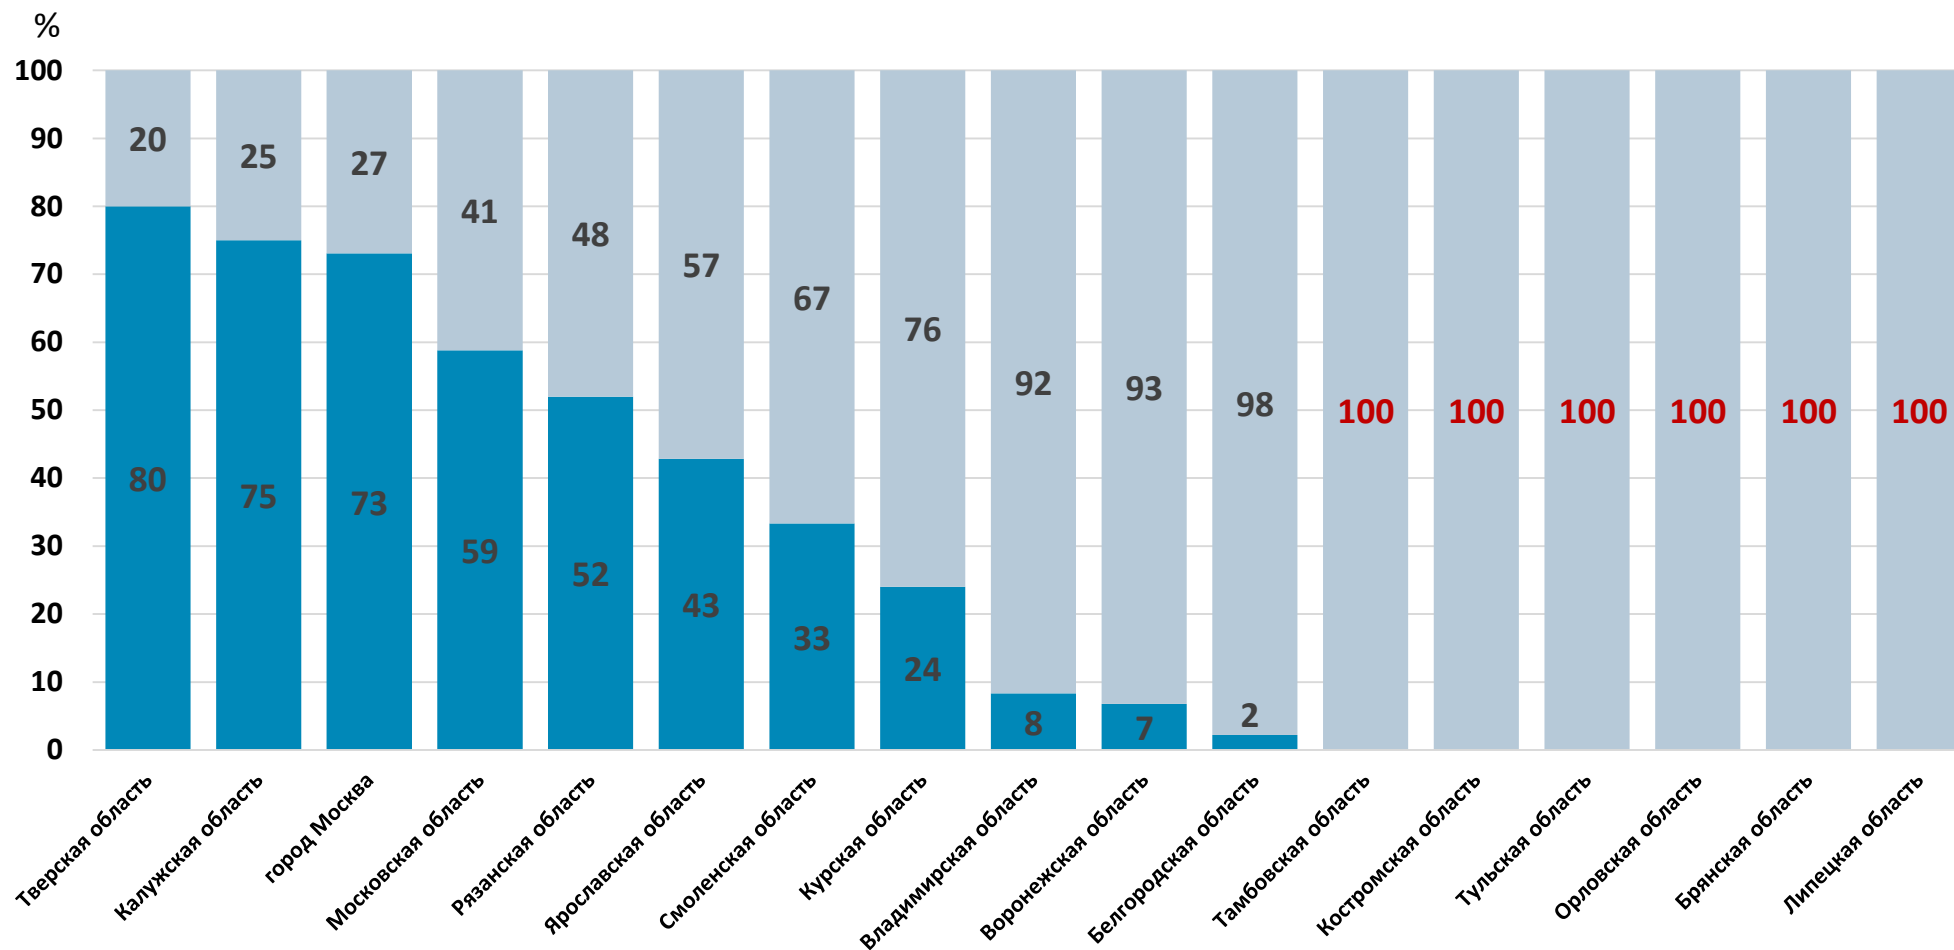


- Доля проведенных конкурсов от общего объема закупок по строительству новых объектов (по количеству), %
- Доля проведенных аукционов от общего объема закупок по строительству новых объектов (по количеству), %



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ ЦФО РФ И СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА

Наименование субъекта РФ	Аукцион			Конкурс		
	Доля состоявшихся торгов, %	Среднее число участников, ед.	Экономия бюджетных средств, %	Доля состоявшихся торгов, %	Среднее число участников, ед.	Экономия бюджетных средств, %
Калужская область	100	4,0	25	100	2,3	1
Ярославская область	100	6,0	5	33	1,7	0
Тульская область	86	2,6	6	-	-	-
город Москва	71	3,1	13	37	1,8	0
Владимирская область	45	2,5	5	50	1,5	12
Рязанская область	42	1,8	9	100	3,2	3
Брянская область	33	2,4	3	-	-	-
Смоленская область	33	3,0	2	33	2,0	2
Тамбовская область	25	3,4	1	-	-	-
Липецкая область	24	1,7	2	-	-	-
Московская область	21	1,1	0	70	2,9	1
Костромская область	15	0,8	2	-	-	-
Воронежская область	13	1,1	4	0	0,8	1
Белгородская область	9	1,1	2	100	3,0	45
Курская область	0	0,7	0	33	1,5	3
Орловская область	0	1,0	0	-	-	-
Тверская область	0	1,0	0	0	0,8	0
Итого по ЦФО	23	1,6	5	55	2,2	1

ПРАКТИКА СУБЪЕКТОВ ЦФО РФ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В 2021Г. ЗАКУПОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТАМ

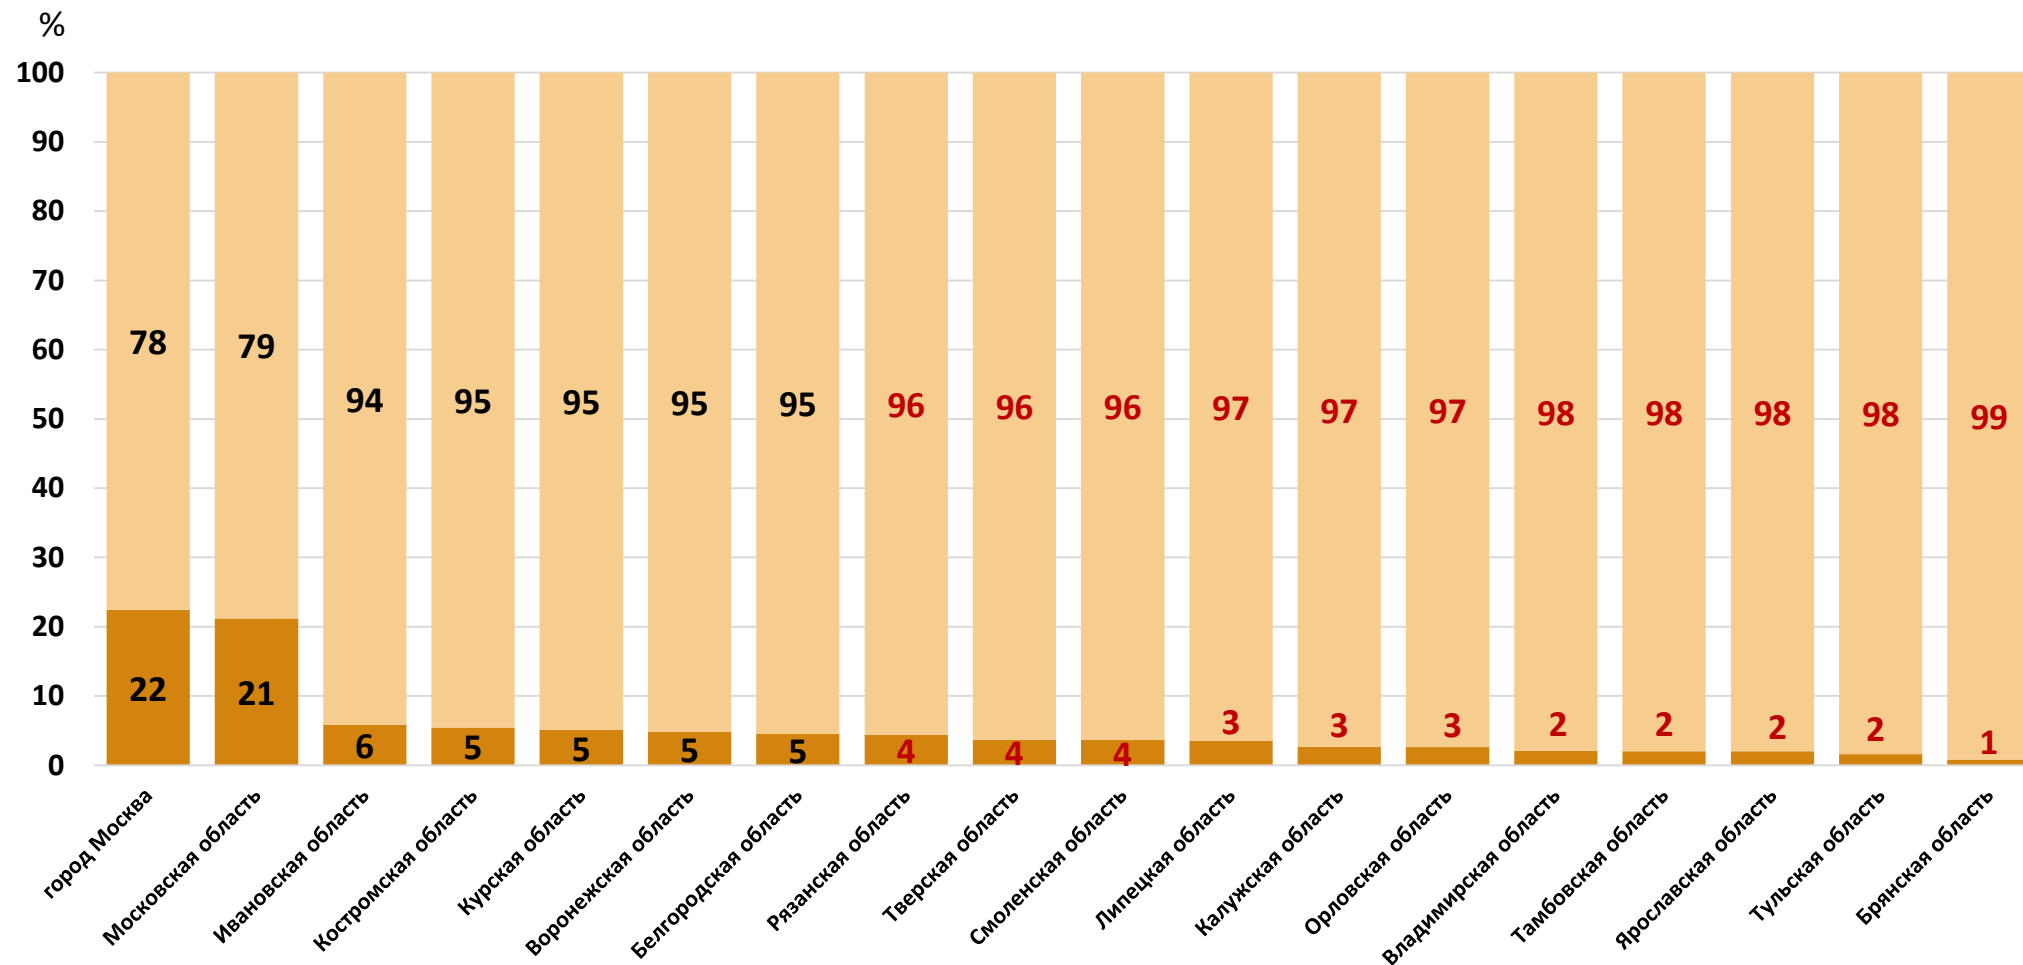(по состоянию на 30.11.2021)



-  Доля проведенных конкурсов от общего объема закупок прочих подрядных работ (по количеству), %
-  Доля проведенных аукционов от общего объема закупок прочих подрядных работ (по количеству), %

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Основная номенклатура товаров, работ, услуг, включенная в обязательный аукционный перечень
(распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 №471-р в редакции от 18.06.2021)

Продукты пищевые

Услуги общественного
питания

Медицинское
оборудование

Бумага и изделия из
бумаги

Услуги по ремонту и
монтажу машин и
оборудования

Нефтепродукты

Услуги по утилизации
отходов

Услуги по дезинфекции,
дезинсекции и
дератизации

Услуги по ремонту
компьютеров

Электрическое
оборудование

Лекарственные средства

Оборудование
компьютерное,
электронное и оптическое

Средства
автотранспортные,
прицепы и полуприцепы

Исключены из
аукционного
перечня
закупки:



➤ строительных работ по кодам 41.2, 42, 43 общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)

➤ продуктов питания и услуг общественного питания образовательными и медицинскими учреждениями

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ПРИ ЗАКУПКЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Нормативное регулирование

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085
«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Стоимостные критерии

Цена контракта.

Минимальная значимость стоимостных
критериев оценки – 60 %.

Нестоимостные критерии

Квалификация, наличие финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов,
опыта работы, деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня
квалификации.

Максимальная значимость нестоимостных
критериев оценки – 40 %

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

Электронный аукцион

2021

36 <i>календарных дней</i>
--

2022

21 <i>календарных дней</i>
--

Преимущества:

- Существенное снижение Н(М)ЦК
- По продолжительности более быстрый способ закупки
- Минимальные трудозатраты по оценке заявок закупочной комиссии заказчика

Недостатки:

- Оценка заявок осуществляется лишь по одному стоимостному критерию - цена, а такие критерии, как качество ТРУ, надежность участников закупки не рассматриваются

Электронный конкурс

2021

46 <i>календарных дней</i>
--

2022

32 <i>календарных дней</i>
--

Преимущества:

- При определении победителя учитывается:
 - предложенная цена контракта;
 - квалификация участников закупки;
 - наличие финансовых, материальных ресурсов, опыта работы, деловой репутации;
- Победителем становится участник, который предложил наилучшие условия исполнения контракта

Недостатки:

- Более длительная процедура проведения закупки по сравнению с электронным аукционом
- Максимальные трудозатраты работы закупочной комиссии по оценке заявок участников закупки

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПОДХОДОВ СУБЪЕКТОВ ЦФО РФ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ Н(М)ЦК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование субъекта ЦФО	Подходы к определению Н(М)ЦК	Доля состоявшихся конкурентных закупок, %	Среднее число поданных заявок	Относительная экономия бюджетных средств, %
1	Брянская область	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) + проектно-сметный метод	55	3,1	6,1
2	город Москва	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) + проектно-сметный метод	65	4,3	3,8
3	Белгородская область	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) + проектно-сметный метод	53	3,8	4,7
4	Курская область	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) + проектно-сметный метод	55	3,1	5,8
5	Костромская область	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) + проектно-сметный метод	52	2,9	3,3
6	Владимирская область	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) + проектно-сметный метод	62	4,4	9,2
7	Московская область	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) + проектно-сметный метод	80	4,0	3,0
8	Ярославская область	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) + проектно-сметный метод	57	2,8	2,0
9	Рязанская область	Проектно-сметный метод	40	1,8	2,3
10	Калужская область	Проектно-сметный метод	41	2,5	6,3
11	Ивановская область	Проектно-сметный метод	39	2,7	3,4
12	Смоленская область	Проектно-сметный метод	40	2,1	4,0
13	Тамбовская область	Проектно-сметный метод	42	2,7	2,8
14	Тверская область	Проектно-сметный метод	35	1,8	3,2
15	Липецкая область	Проектно-сметный метод	48	2,7	6,0
16	Тульская область	Проектно-сметный метод	46	2,6	7,9
17	Орловская область	Проектно-сметный метод	41	2,0	2,7
18	Воронежская область	Проектно-сметный метод	38	2,0	3,0

КАЧЕСТВЕННОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА – ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАКУПКИ

Цель маркетингового исследования рынка:

- Изучить рынок на предмет наличия конкуренции и определить эффективный способ закупки
- Оценить возможности хозяйствующих субъектов исполнить контракт на заявленных условиях и при необходимости скорректировать техническое задание
- Рассчитать экономически обоснованную Н(М)ЦК с учетом коммерческих предложений
- Провести с потенциальными участниками закупок рабочие встречи до объявления извещения о закупке и спрогнозировать риски при осуществлении закупки

Эффекты:

- Выстраивание партнерских отношений с субъектами рынка
- Сокращение случаев несостоявшихся торгов
- Повышение эффективности расходования бюджетных средств
- Своевременное и качественное исполнение контракта



ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ С 01.01.2022

!!! В случае включения заказчиком в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства конкурс проходит в сокращенном режиме, без предоставления участником закупки 1 частей заявок

Шаги заказчика при проведении конкурса на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию

Шаг 1

Размещается извещение **не менее чем за 15 дней** до даты окончания срока подачи заявок

Шаг 2

В течение **2 рабочих дней**:

- рассматриваются вторые части заявок участников закупки;
- формируется протокол рассмотрения и оценки вторых частей и направляется оператору ЭП

Шаг 3

В течение **1 рабочего дня** со дня получения предложения о цене контракта:

- оцениваются ценовые предложения участников закупки;
- формируется протокол подведения итогов и направляется оператору ЭП

Шаг 4

Контракт заключается **не ранее чем через 10 дней** с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов

Длительность процедуры с момента размещения извещения до заключения контракта составляет **32** дня

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА НА ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ №44-ФЗ с 01.01.2022

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 95 Закона №44-ФЗ, в том числе:

1. **При снижении цены контракта** без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий контракта (п.1.1 ч.1 ст.95)

2. **При изменении объема и (или) видов выполняемых работ** по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия – **изменение цены контракта не более чем на 10% цены контракта** (п.1.3 ч.1 ст.95)

3. Исполнение контракта для **нужд субъекта РФ** по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены при соблюдении следующих условий (п.3 ч.1 ст.95):

- *контракт заключен на срок – не менее чем 3 года*
- *цена контракта > 1 млрд.рублей*
- *наличие решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ*

4. Исполнение контракта для **муниципальных нужд** по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены при соблюдении следующих условий (п.4 ч.1 ст.95):

- *контракт за заключен на срок – не менее 1 года*
- *цена контракта > 500 млн.рублей*
- *наличие решения местной администрации*

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА НА ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ №44-ФЗ с 01.01.2022

5. При исполнении контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию может быть изменен срок исполнения контракта и (или) цена не более чем на 30% при соблюдении следующих условий (п.8 ч.1 ст.95):

- *срок исполнения контракта – не менее 1 года*
- *цена > 100 млн.рублей*
- *наличие письменного обоснования такого изменения*
- *наличие решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации*

6. При уменьшении ранее доведенных до государственного, муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 161 БК РФ (ч.3 ст.95):

на бюджетные учреждения не распространяется

7. При исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика контракт не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта при соблюдении следующих условий (п.9 ч.1 ст.95):

- *изменение однократно*
- *контракт продлевается на срок, не превышающий срок его действия*
- *отсутствуют неисполненные подрядчиком требования об уплате неустоек (штрафов, пеней)*
- *подрядчик предоставил обеспечение исполнения контракта*

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА НА ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ №44-ФЗ с 01.01.2022

7. При исполнении контракта жизненного цикла, контракта, контракта, предметом которого является проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы заказчики вправе изменить цену контракта (п.11 ч.1 ст.95):

- *решение администрации Липецкой области, местной администрации*
- *увеличение цены контракта не может составлять более 30%*

8. При уменьшении ранее доведенных до государственного, муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 161 БК РФ (ч.3 ст.95):
на бюджетные учреждения не распространяется

9. При исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа исполнения контракта (п.12 ч.1 ст.95)

10. При исполнении контракта жизненного цикла, контракта, контракта, предметом которого является проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию цена контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации. Цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости (ч.1.2 ст.95)

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОНТРАКТ

!!! Все изменения в заключенный контракт оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается сторонами контракта и размещается в ЕИС

!!! Изменения не должны противоречить нормам Закона №44-ФЗ

Часть 4 статьи 7.32. КоАП РФ **изменение условий контракта**, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, **если возможность изменения** условий контракта **не предусмотрена законодательством** Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, **влечет наложение** административного **штрафа**:

- на должностных лиц в размере **двадцати** тысяч рублей;
- на юридических лиц - **двухсот** тысяч рублей.

ПРАВОВАЯ БАЗА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ В СВЯЗИ С СУЩЕСТВЕННЫМ УДОРОЖАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пункт 8 части 1
статьи 95 Закона
№44-ФЗ

Постановление
Правительства РФ
от 19.12.2013 №1186

П.3 Постановления
Правительства РФ
от 09.08.2021 №1315

Постановление
Правительства РФ
от 05.03.2007 №145

Приказ Министра
России от
23.12.2019 №841/пр

Критерии применения пункта 8 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ с учетом положений Постановления Правительства РФ №1315

Предмет контракта	выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия
Срок действия контракта	не менее 1 года
Цена контракта	≥ 1 млн.рублей
Предельная дата заключения контракта	до 01.10.2021

Совокупность условий для изменения цены контрактов:

- изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на **30%**
- физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения **не изменяются**
- наличие письменного обоснования такого изменения со стороны подрядчика
- наличие решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации
- заключение соглашения между заказчиком и подрядчиком об изменении контракта заключается на основании обращения подрядчика об изменении условий в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, с приложением подтверждающих документов и информации

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПОДРЯДЧИК

в рамках приказа Минстроя №841-пр

- Проводит оценку на предмет возможности исполнения контракта
- Проводит маркетинговое исследование рынка на период внесения изменений
- Выполняет Расчет в письменной форме с обоснованием изменения цены контракта
- Направляет Расчет заказчику

ЗАКАЗЧИК

- Проводит проверку Расчета обоснования изменения цены контракта, представленного подрядчиком
- Корректирует смету к контракту, цена которого ≥ 30 млн. руб.
- Направляет смету на экспертизу если цена контракта ≥ 100 млн. руб.
- Согласовывает с управлением финансов выделенные лимиты бюджетных обязательств
- Утверждает откорректированную смету к контракту и согласовывает её с подрядчиком
- Подписывает дополнительное соглашение к контракту с подрядчиком на основании п.8 ч.1 ст.95 44-ФЗ

ЭКСПЕРТИЗА

в рамках постановления правительства №145

- Проводит проверку достоверности определения сметной стоимости на основании изучения и оценки расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия таким сметным нормативам, расценкам, ценам, методическим и другим документам в сфере ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности

Цена
контракта
до 30
млн.рублей

Расчет обоснования изменения цены контракта выполняется в разрезе строительных ресурсов
суммарная стоимость которых с учетом объема поставки по контракту в целом составляет не менее 80 % от общей стоимости всего объема строительных ресурсов, необходимых для исполнения контракта, закупка которых еще не была произведена

Цена контракта
от 30 до 100
млн.рублей

Расчет выполняется с использованием коэффициента корректировки цены контракта, рассчитанного на основании стоимости строительства, определенной с использованием ежеквартальных укрупненных индексов изменения сметной стоимости, сообщаемых Минстроем России

Цена
контракта
от 100
млн.рублей

Обязательная государственная
экспертиза на проверку
достоверности сметной
стоимости

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 09.08.2021 № 1315 по состоянию на 26.11.2021

№ п/п	Наименование муниципального образования	Отсутствует необходимость в принятии МПА	На согласовании у соответствующего органа (юристы, прокуратура)	Принятые МПА (реквизиты)	Работа по корректировке МПА	Наличие в документе перечня заказчиков
1	Грязинский район			Постан. от 22.09.21 № 973	в работе	+
2	Хлевенский район			Постан. от 22.09.21 № 364	в работе	+
3	Лебедянский район			Постан. от 24.09.21 № 821	в работе	+
4	Добровский район			Постан. от 28.09.21 № 746	в работе	-
5	г. Елец			Постан. от 08.10.21 № 1529	в работе	+
6	Тербунский район			Постан. от 25.10.21 № 145	в работе	+
7	Елецкий район			Постан. от 10.11.21 № 759 (принято с учетом изменений*)		+
8	Становлянский район			Постан. от 17.11.21 № 457 (принято с учетом изменений*)		+
9	г. Липецк		+			
10	Добринский район		+			
11	Воловский район	+				
12	Данковский район	+				
13	Долгоруковский район	+				
14	Задонский район	+				
15	Измалковский район	+				
16	Краснинский район	+				
17	Липецкий район	+				
18	Лев-Толстовский район	+				
19	Усманский район	+				
20	Чаплыгинский район	+				
	ИТОГО	10	2	8	6	7

* Постановлением Правительства РФ от 22.10.2021 № 1812 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315, которые вступили в силу с 09.11.2021. Изменения касаются контрактов, заключенных до 01.10.2021.

ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАЗЧИКА И УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАКУПКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКАЗЧИК

I. Планирование закупок

II. Выбор способа определения поставщика

III. Определение характеристик предмета закупки:

- описание объекта закупки
- установление требований к качеству и количественным характеристикам товара

IV. Определение условий закупки (место и срок поставки, источник финансирования, форма и сроки оплаты, предоставляемые преимущества, порядок и сроки приемки товара, права и обязанности сторон по контракту, их ответственность, срок действия контракта.

V. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта

VI. Подписание извещения об осуществлении закупки

VII. Подписание и исполнение контракта (экспертиза, приёмка, оплата)

УПОЛНОМОЧЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА, ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ

I. Установление порядка подачи заказчиками заявок в УУ на определение поставщика

II. Определение для потенциальных поставщиков требований к заявке, инструкция по её заполнению

1. Дата и время окончания срока подачи заявок
2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок
4. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений документации

III. Подготовка, подписание и размещение в ЕИС соответствующих протоколов

- *действия уполномоченного учреждения определены ч.1 ст.26 закона № 44-ФЗ*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

398014, г. Липецк, пл. Ленина - Соборная, 1

www.admlip.ru

Главам администраций
муниципальных районов и
городских округов Липецкой
области

13.01.21 №ИА-45

В соответствии с Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.01.2019 г. № 117-р, в целях обеспечения конкурентной и прозрачной системы закупок для муниципальных нужд, совершенствования правил и процедур бухгалтерского учета и финансовой отчетности для организаций государственного сектора, повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса, формирования единого информационного контура системы управления общественными финансами, администрация Липецкой области рекомендует провести мероприятия по созданию центров компетенций в форме муниципальных казенных учреждений (далее – Учреждения) со следующими основными функциями:

- осуществление полномочий по определению конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведение совместных закупок для муниципальных нужд с 2021 года;
- осуществление полномочий по централизованному ведению бюджетного (бухгалтерского) учета с 1 января 2022 года.

В целях реализации новой модели организации системы закупок и обеспечения непрерывного процесса закупочной деятельности на муниципальном уровне необходимо провести следующие мероприятия:

1. В соответствии с частью 10 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -

Закон № 44-ФЗ) определить Порядок взаимодействия заказчиков с Учреждением.

2. В соответствии со статьей 26 Закона № 44-ФЗ заключить соглашения с администрациями сельских поселений о передаче полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами.

При этом необходимо учесть, что закупки в соответствии со статьей 93 Закона № 44-ФЗ, включая закупки на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, осуществляются заказчиками муниципальных образований, в том числе сельских поселений, самостоятельно.

Кроме того, Учреждение имеет право в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона № 44-ФЗ осуществлять совместные закупки для нужд заказчиков, в том числе сельских поселений, на основании заключенных соглашений в отношении каждой совместной закупки.

Главам администраций муниципальных районов и городских округов необходимо довести указанную информацию до глав сельских и городских поселений.

При принятии организационной модели закупок соответствующего муниципального образования заказчикам требуется внести изменения в планы-графики и представить информацию о планируемых централизованных закупках в Учреждение.

О проделанной работе представить информацию в администрацию Липецкой области в срок до 1 марта 2021 года, обобщает управление финансов Липецкой области.

Глава администрации
Липецкой области

И.Г. Артамонов

Наименование муниципальных образований, в которых созданы центры компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа	Начало взаимодействия с муниципальными заказчиками	Объем объявленных закупок	
		Кол-во	Сумма, млн. руб.
Усманский район	март	140	263
Краснинский район	апрель	125	110
Грязинский район	апрель	73	392
Воловский район	апрель	79	124
Данковский район	апрель	65	176
Тербунский район	апрель	71	119
Добринский район	апрель	69	55
Чаплыгинский район	апрель	82	214
Становлянский район	апрель	48	156
Долгоруковский район	апрель	35	68
Хлевенский район	апрель	23	125
Елецкий район	апрель	29	23
Добровский район	апрель	50	179
Лебедянский район	май	112	229
Липецкий район	май	59	237
Измалковский район	май	23	70
Лев-Толстовский район	июнь	38	99
г. Липецк	август	351	1 169
Задонский район	август	58	98
г. Елец	октябрь	10	0,5
ИТОГО		1 540	3 906,5

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

г.Липецк	<ul style="list-style-type: none"> • 3 заказчика осуществляют закупки самостоятельно • для 30 заказчиков УУ осуществляют все конкурентные закупки вне зависимости от Н(М)ЦК • для 156 заказчиков УУ осуществляет конкурентные закупки свыше 600 тыс.рублей
Добровский район	<ul style="list-style-type: none"> • УУ осуществляет конкурентные закупки свыше 600 тыс.рублей
Измалковский район	<ul style="list-style-type: none"> • 11 заказчиков осуществляют закупки самостоятельно • для 57 заказчиков УУ осуществляет конкурентные закупки
г.Елец Воловский, Грязинский Данковский Добринский Долгоруковский Елецкий Задонский Краснинский Лебедянский Лев-Толстовский Липецкий Становлянский Тербунский Усманский Хлевенский Чаплыгинский	<ul style="list-style-type: none"> • УУ осуществляет закупки для нужд заказчиков конкурентными способами
